

# Pemantauan Kinerja Program dan Keuangan Proses Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2019



Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

1

Latar Belakang





1. Kemendikbud melalui BAN PAUD dan PNF memfasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2019 di Provinsi melalui **Bantuan Pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Balitbang Kemendikbud.**
2. Dengan pola penganggaran melalui Bantuan Pemerintah, **70% anggaran telah tersedia** pada awal tahun, sedangkan **30% anggaran** akan diterima pada akhir pelaksanaan setelah **prestasi 70% tercapai**, sehingga diperlukan **perencanaan yang pasti** dan **pemantauan yang rutin** agar anggaran **tidak stagnan.**
3. **Rencana Kerja Tahunan** ditandatangani **Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi** dan **Ketua BAN PAUD dan PNF** di pusat.
4. **Capaian kinerja** akreditasi perlu diimbangi dengan **capaian keuangan yang tertib.**
5. Berdasarkan prinsip akuntansi, **capaian fisik/kinerja** harus **lebih besar atau sama dengan capaian keuangan.**
6. Untuk mempermudah pelaksana kegiatan, sistem Uang Muka diterapkan namun demikian penyelesaian **pertanggungjawaban keuangan** harus **tidak terlambat** atau bahkan menghindari **fiktif.**
7. **Keseimbangan** pengeluaran **beban manajemen** dengan **kinerja.**

2

Dasar Hukum



# DASAR HUKUM



**Permendikbud No.13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF**



**Permendikbud No.17 Tahun 2018 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud (Perubahan)**



**1. Perkalitbang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah**  
**2. Perkalitbang tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah**



**1. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah**  
**2. Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah**



**Perjanjian Kerja Sama**

3

Rencana Pelaksanaan Akreditasi



# RENCANA PELAKSANAAN AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2019



## JUMLAH SASARAN

- 35.750 Satuan Pendidikan

## PRIORITAS JUMLAH SASARAN AKREDITASI

- Prioritas satuan pendidikan yang **perlu diakreditasi**
- PAUD → **prioritas Nasional** program PAUD
- LKP → kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan **Dunia Usaha Dunia Industri**
- PKBM → diperlukan pada **pelaksanaan Ujian Nasional**

## MEKANISME PELAKSANAAN

- Akreditasi Online (SISPENA – Sistem Penilaian Akreditasi) berbasis **DAPODIK**
- Koordinasi **pemetaan mutu** di Ditjen PAUD dan Dikmas
- Berkoordinasi dengan **Organisasi Mitra**
- Ketersediaan Asesor

4

Jadwal Pelaksanaan Akreditasi





# JADWAL PELAKSANAAN AKREDITASI (INSTRUMEN BARU)



Penandatanganan PKS/  
Pendistribusian Dana  
Bantuan Pemerintah  
Jan-Feb

## BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

Laporan  
Hasil Akreditasi  
Tahap 1  
April-Mei

Pelaksanaan  
Akreditasi  
Feb-Des

Evaluasi  
Pelaksanaan  
Jul - Ags

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Pengembangan Instrumen  
Akreditasi  
Maret-April

TAHAP KE - 1 (70%)

TAHAP KE - 2 (30%)

Penerimaan dan penilaian  
usulan/proposal serta  
Verifikasi dan Penetapan  
Penerima Bantuan  
Januari

Laporan  
Hasil Akreditasi  
Tahap 2  
Juni-Agt

Laporan  
Hasil Akreditasi  
Tahap 3  
Sept-Des



# TABEL RENCANA SERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET



KOMPONEN	Volume		Anggaran	MARET		Sisa	Persentase Realisasi	Pengesahan Ketua
				Rencana	Realisasi			
			3.910.125.000	74.628.800	71.828.800	2.800.000	1,84%	
<b>1. MANAJEMEN AKREDITASI</b>			<b>522.946.000</b>	<b>43.578.800</b>	<b>42.178.800</b>	<b>1.400.000</b>	<b>8,07%</b>	
A. OPERASIONAL	12	Bulan	515.746.000	42.978.800	41.578.800	1.400.000	8,06%	
B. JARINGAN INTERNET	12	Bulan	7.200.000	600.000	600.000	-	8,33%	
<b>2. PELAKSANAAN AKREDITASI</b>			<b>3.387.179.000</b>	<b>31.050.000</b>	<b>29.650.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,88%</b>	
A. RAPAT PROGRAM AKREDITASI	12	Kali	286.200.000	23.850.000	23.150.000	700.000	8,09%	
B. KOORDINASI PELAKSANAAN AKREDITASI			692.626.000	-	-		0,00%	
1. Rapat Koordinasi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi	1	Kali	42.495.000					
2. Koordinasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan BAN PAUD DAN PNF	3	Kali	85.230.000					
3. Rapat Koordinasi Daerah	2	Kali	193.760.000					
4. Sosialisasi Akreditasi	23	Kab/Kota	337.780.000					
5. Pengelolaan Akreditasi	1	Kali	33.361.000					
C. PELATIHAN			184.910.000	-	-	-	0,00%	
1. Seleksi Calon Asesor	18	Orang	15.250.000					
2. Pelatihan Asesor Baru	0	Orang	-					
3. Pelatihan Asesor Refresh	58	Orang	153.910.000					
4. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi	1	Kali	15.750.000					
D. KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI	3	Kali	28.720.000				0,00%	
E. VISITASI AKREDITASI	500	Satuan	1.714.460.000				0,00%	
F. VALIDASI DAN VERIFIKASI AKREDITASI	2	Kali	277.574.000				0,00%	
G. SUPERVISI AKREDITASI	23	Kab/Kota	110.880.000				0,00%	
H. PUBLIKASI HASIL AKREDITASI	1	Kali	5.409.000				0,00%	
I. PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH	12	Kali	86.400.000	7.200.000	6.500.000	700.000	7,52%	

# CONTOH RINGKASAN BUKU KAS UMUM



TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
01/01/2019		Saldo Awal			-
04/03/2019	001/UMK.01/2019	UPKK - Terima UMK (Penarikan Saldo di Rekening)	50,000,000		50,000,000
15/03/2019	1/UMK.01	Anggota A, <b>Uang Saku</b> Kegiatan <b>Klasifikasi Permohonan Akreditasi</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF, tgl. 15 Maret 2019		350,000	49,650,000
15/03/2019	2/UMK.01	Anggota B, kegiatan -sda-		350,000	49,300,000
15/03/2019	3/UMK.01	Anggota C, kegiatan -sda-		350,000	48,950,000
15/03/2019	4/UMK.01	Anggota D, kegiatan -sda-		350,000	48,600,000
15/03/2019	5/UMK.01	Anggota E, kegiatan -sda-		350,000	48,250,000
15/03/2019	6/UMK.01	Anggota F, kegiatan -sda-		350,000	47,900,000
15/03/2019	7/UMK.01	Sekretariat G, kegiatan -sda-		350,000	47,550,000
15/03/2019	8/UMK.01	Sekretariat H, kegiatan -sda-		350,000	47,200,000
15/03/2019	9/UMK.01	Sekretariat I, kegiatan -sda-		350,000	46,850,000
15/03/2019	10/UMK.01	Sekretariat J, kegiatan -sda-		350,000	46,500,000
20/03/2019	11/UMK.01	Asesor A, <b>Honorarium</b> Kegiatan <b>Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF di LKP C Kab. X, tgl. 20 Maret 2019		1,000,000	45,500,000
20/03/2019	12/UMK.01	Asesor B, kegiatan -sda-		1,000,000	44,500,000
20/03/2019	13/UMK.01	Asesor A, <b>Biaya Transport</b> Kegiatan <b>Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF di LKP C Kab. X, tgl. 20 Maret 2019		270,000	44,230,000
20/03/2019	14/UMK.01	Asesor B, kegiatan -sda-		270,000	43,960,000
20/03/2019	15/UMK.01	Asesor A, <b>Biaya Penginapan</b> Kegiatan <b>Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF di LKP C Kab. X, tgl. 20 Maret 2019		375,000	43,585,000
20/03/2019	16/UMK.01	Asesor B, kegiatan -sda-		375,000	43,210,000
29/03/2019	17/UMK.01	Asesor C, <b>Honorarium</b> Kegiatan <b>Validasi dan Verifikasi Akreditasi PAUD dan PNF</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF, tgl. 27-29 Maret 2019		2,400,000	40,810,000
29/03/2019	18/UMK.01	Asesor D, kegiatan -sda-		2,400,000	38,410,000
29/03/2019	19/UMK.01	Asesor C, <b>Biaya Transport</b> Kegiatan <b>Validasi dan Verifikasi Akreditasi PAUD dan PNF</b> dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF, tgl. 27-29 Maret 2019		300,000	38,110,000
29/03/2019	20/UMK.01	Asesor D, kegiatan -sda-		300,000	37,810,000

# TABEL REKAPITULASI RENCANA SERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN



KOMPONEN	Volume		Anggaran	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
				3.910.125.000	74.628.800	71.828.800	74.628.800	70.927.360	419.048.900	393.941.966	290.871.300	282.163.161	846.184.400	812.361.024	609.529.800
<b>1. MANAJEMEN AKREDITASI</b>			<b>522.946.000</b>	<b>43.578.800</b>	<b>42.178.800</b>	<b>43.578.800</b>	<b>41.429.860</b>	<b>43.578.800</b>	<b>41.000.072</b>	<b>43.578.800</b>	<b>42.289.436</b>	<b>43.578.800</b>	<b>41.859.648</b>	<b>43.578.800</b>	<b>41.000.072</b>
A. OPERASIONAL	12	Bulan	515.746.000	42.978.800	41.578.800	42.978.800	40.829.860	42.978.800	40.400.072	42.978.800	41.689.436	42.978.800	41.259.648	42.978.800	40.400.072
B. JARINGAN INTERNET	12	Bulan	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>2. PELAKSANAAN AKREDITASI</b>			<b>3.387.179.000</b>	<b>31.050.000</b>	<b>29.650.000</b>	<b>31.050.000</b>	<b>29.497.500</b>	<b>375.470.100</b>	<b>352.941.894</b>	<b>247.292.500</b>	<b>239.873.725</b>	<b>802.605.600</b>	<b>770.501.376</b>	<b>565.951.000</b>	<b>531.993.940</b>
A. RAPAT PROGRAM AKREDITASI	12	Kali	286.200.000	23.850.000	23.150.000	23.850.000	22.657.500	23.850.000	22.419.000	23.850.000	23.134.500	23.850.000	22.896.000	23.850.000	22.419.000
B. KOORDINASI PELAKSANAAN AKREDITASI			692.626.000	-	-	-	-	319.596.800	300.420.992	190.919.200	185.191.624	-	-	-	-
1. Rapat Koordinasi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi	1	Kali	42.495.000					42.495.000	39.945.300						
2. Koordinasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan BAN PAUD DAN PNF	3	Kali	85.230.000												
3. Rapat Koordinasi Daerah	2	Kali	193.760.000					96.880.000	91.067.200						
4. Sosialisasi Akreditasi	23	Kab/Kota	337.780.000					146.860.800	138.049.152	190.919.200	185.191.624				
5. Pengelolaan Akreditasi	1	Kali	33.361.000					33.361.000	31.359.340						
C. PELATIHAN			184.910.000	-	-	-	-	15.250.000	14.335.000	15.750.000	15.277.500	-	-	153.910.000	144.675.400
1. Seleksi Calon Asesor	18	Orang	15.250.000					15.250.000	14.335.000						
2. Pelatihan Asesor Baru	0	Orang	-												
3. Pelatihan Asesor Refresh	58	Orang	153.910.000											153.910.000	144.675.400
4. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi	1	Kali	15.750.000							15.750.000	15.277.500				
D. KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI	3	Kali	28.720.000					9.573.300	8.998.902	9.573.300	9.286.101	9.573.400	9.190.464		
E. VISITASI AKREDITASI	500	Satuan	1.714.460.000									761.982.200	731.502.912	380.991.000	358.131.540
F. VALIDASI DAN VERIFIKASI AKREDITASI	2	Kali	277.574.000												
G. SUPERVISI AKREDITASI	23	Kab/Kota	110.880.000												
H. PUBLIKASI HASIL AKREDITASI	1	Kali	5.409.000												
I. PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH	12	Kali	86.400.000	7.200.000	6.500.000	7.200.000	6.840.000	7.200.000	6.768.000	7.200.000	6.984.000	7.200.000	6.912.000	7.200.000	6.768.000

KOMPONEN	Volume		Anggaran	Jul		Ags		Sep		Okt		Nov		Des		Total	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
				3.910.125.000	213.415.800	198.518.694	484.029.800	469.526.906	303.691.600	291.567.936	377.272.800	347.138.976	108.375.100	101.908.594	108.447.900	103.055.505	3.910.125.000
<b>1. MANAJEMEN AKREDITASI</b>			<b>522.946.000</b>	<b>43.578.800</b>	<b>40.570.284</b>	<b>43.578.800</b>	<b>42.289.436</b>	<b>43.578.900</b>	<b>41.859.744</b>	<b>43.578.900</b>	<b>40.140.588</b>	<b>43.578.900</b>	<b>41.000.166</b>	<b>43.578.900</b>	<b>41.429.955</b>	<b>522.946.000</b>	<b>497.048.061</b>
A. OPERASIONAL	12	Bulan	515.746.000	42.978.800	39.970.284	42.978.800	41.689.436	42.978.900	41.259.744	42.978.900	39.540.588	42.978.900	40.400.166	42.978.900	40.829.955	1.437.531.206	964.764.106
B. JARINGAN INTERNET	12	Bulan	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	20.400.000	13.800.000
<b>2. PELAKSANAAN AKREDITASI</b>			<b>3.387.179.000</b>	<b>169.837.000</b>	<b>157.948.410</b>	<b>440.451.000</b>	<b>427.237.470</b>	<b>260.112.700</b>	<b>249.708.192</b>	<b>333.693.900</b>	<b>306.998.388</b>	<b>64.796.200</b>	<b>60.908.428</b>	<b>64.869.000</b>	<b>61.625.550</b>	<b>3.387.179.000</b>	<b>3.218.884.873</b>
A. RAPAT PROGRAM AKREDITASI	12	Kali	286.200.000	23.850.000	22.180.500	23.850.000	23.134.500	23.850.000	22.896.000	23.850.000	21.942.000	23.850.000	22.419.000	23.850.000	22.657.500	797.798.000	535.448.000
B. KOORDINASI PELAKSANAAN AKREDITASI			692.626.000	-	-	28.410.000	27.557.700	-	-	125.290.000	115.266.800	-	-	28.410.000	26.989.500	692.626.000	655.426.616
1. Rapat Koordinasi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi	1	Kali	42.495.000													124.935.300	82.440.300
2. Koordinasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan BAN PAUD DAN PNF	3	Kali	85.230.000			28.410.000	27.557.700			28.410.000	26.137.200			28.410.000	26.989.500	195.744.900	138.924.900
3. Rapat Koordinasi Daerah	2	Kali	193.760.000							96.880.000	89.129.600					567.716.800	373.956.800
4. Sosialisasi Akreditasi	23	Kab/Kota	337.780.000													998.800.776	661.020.776
5. Pengelolaan Akreditasi	1	Kali	33.361.000													98.081.340	64.720.340
C. PELATIHAN			184.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.910.000	174.287.900
1. Seleksi Calon Asesor	18	Orang	15.250.000													44.835.000	29.585.000
2. Pelatihan Asesor Baru	0	Orang	-													-	-
3. Pelatihan Asesor Refresh	58	Orang	153.910.000													452.495.400	298.585.400
4. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi	1	Kali	15.750.000													46.777.500	31.027.500
D. KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI	3	Kali	28.720.000													84.915.467	56.195.467
E. VISITASI AKREDITASI	500	Satuan	1.714.460.000			380.991.000	369.561.270	190.495.800	182.875.968							5.070.991.690	3.356.531.690
F. VALIDASI DAN VERIFIKASI AKREDITASI	2	Kali	277.574.000	138.787.000	129.071.910					138.787.000	127.684.040					811.903.950	534.329.950
G. SUPERVISI AKREDITASI	23	Kab/Kota	110.880.000					38.566.900	37.024.224	38.566.900	35.481.548	33.746.200	31.721.428,00			325.987.200	215.107.200
H. PUBLIKASI HASIL AKREDITASI	1	Kali	5.409.000											5.409.000	5.138.550	5.409.000	5.409.000
I. PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH	12	Kali	86.400.000	7.200.000	6.696.000	7.200.000	6.984.000	7.200.000	6.912.000	7.200.000	6.624.000	7.200.000	6.768.000	7.200.000	6.840.000	240.356.000	161.156.000

# CONTOH PERHITUNGAN BOBOT PER KEGIATAN



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		
	FISIK		BOBOT
	SASARAN	SATUAN	
<b>1. MANAJEMEN AKREDITASI</b>			<b>2,99%</b>
A. OPERASIONAL BAN-P	12	Bulan	2,93%
B. JARINGAN INTERNET	12	Bulan	0,06%
<b>2. PELAKSANAAN AKREDITASI</b>			<b>97,01%</b>
A. RAPAT PROGRAM AKREDITASI	14	Kali	1,25%
B. KOORDINASI PELAKSANAAN AKREDITASI			5,95%
1. Rapat Koordinasi BAN Pusat dengan BAN-P	2	Kali	0,04%
2. Koordinasi BAN-P dengan BAN Pusat	3	Kali	0,22%
3. Rapat Koordinasi Daerah BAN-P	2	Kali	1,64%
4. Sosialisasi Akreditasi di Kab/Kota	28	Kab/Kota	3,91%
5. Pengelolaan Akreditasi	1	Kali	0,14%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		
	FISIK		BOBOT
	SASARAN	SATUAN	
C. PELATIHAN			9,66%
1. Seleksi Calon Asesor	1	kali	0,20%
2. Pelatihan Asesor Baru	68	Orang	5,91%
3. Pelatihan Asesor Refresh	872	Orang	8,51%
4. Sosialisasi SIMA	1	Kali	0,04%
D. KLASIFIKASI PENILAIAN AKREDITASI	15	Kali	<b>14,25%</b>
E. VISITASI AKREDITASI	6000	Satuan	<b>46,75%</b>
F. VALIDASI DAN VERIFIKASI AKREDITASI	6	Kali	<b>12,70%</b>
G. SUPERVISI AKREDITASI	38	Kali	0,67%
H. PUBLIKASI HASIL AKREDITASI	1	Kali	0,06%
I. PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH	12	Kali	0,70%


CATATAN : D, E, F Langkah Akreditasi

# GRAFIK RENCANA SERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN



No.	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan (Ribuan)	74.629	74.629	419.049	290.871	846.184	609.530	213.416	484.030	303.692	377.273	108.375	108.448
2	% penyerapan	1,91%	3,82%	14,53%	21,97%	43,61%	59,20%	64,66%	77,04%	84,81%	94,45%	97,23%	100,00%
3	Realisasi Bulanan (Ribuan)	71.829	70.927	393.942	282.163	812.361	572.994	198.519	469.527	291.568	347.139	101.909	103.056
4	% realisasi	1,84%	3,65%	13,73%	20,94%	41,72%	56,37%	61,45%	73,46%	80,91%	89,79%	92,40%	95,03%

GRAFIK RENCANA SERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN

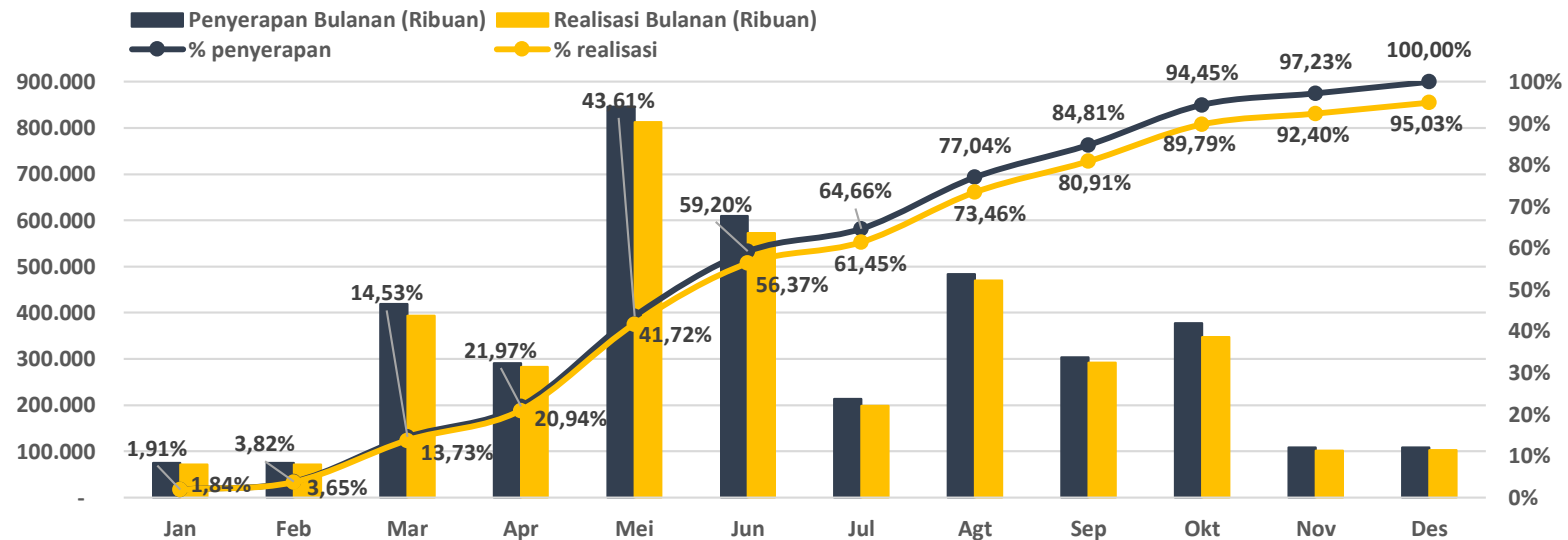

KEGIATAN	BOBOT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
MANAJEMEN AKREDITASI	49,12%	1,84%	3,68%	13,65%	20,90%	22,74%	28,56%	30,39%	33,06%	35,89%	39,55%	42,26%	49,12%
PELAKSANAAN AKREDITASI	50,88%	0,00%	0,00%	4,58%	9,17%	29,70%	37,68%	48,27%	50,88%	50,88%	50,88%	50,88%	50,88%
a. Klasifikasi Penilaian Akreditasi	13,75%			4,58%	9,17%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%
- Target Kuota 500 Satuan				200	150	150							
b. Visitasi Akreditasi	31,90%					15,95%	23,93%	31,90%	31,90%	31,90%	31,90%	31,90%	31,90%
- Target Kuota 500 Satuan						250	125	125					
c. Validasi Akreditasi	5,23%							2,62%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%
- Target Kuota 500 Satuan								250	250				
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,84%</b>	<b>3,68%</b>	<b>18,23%</b>	<b>30,07%</b>	<b>52,44%</b>	<b>66,24%</b>	<b>78,66%</b>	<b>83,94%</b>	<b>86,77%</b>	<b>90,43%</b>	<b>93,14%</b>	<b>100,00%</b>

5

Satuan Biaya dan Bobot Prestasi  
Pelaksanaan Akreditasi






# CONTOH SATUAN BIAYA PELAKSANAAN AKREDITASI



NO	PROVINSI	KUOTA	PAGU TOTAL	UNIT COST PAGU TOTAL	ANGGARAN MANAJEMEN	UNIT COST MANAJEMEN	% MANAJEMEN	ANGGARAN AKREDITASI	UNIT COST AKREDITASI	% AKREDITASI
1	A	5.000	22.764.419.000	4.552.884	4.391.974.000	878.395	<b>19,29</b>	18.372.445.000	3.674.489	<b>80,71</b>
2	B	500	3.910.125.000	7.820.250	1.934.935.000	3.869.870	<b>49,49</b>	1.975.190.000	3.950.380	<b>50,51</b>
3	C	200	4.665.198.000	23.325.990	3.286.479.000	16.432.395	<b>70,45</b>	1.378.719.000	6.893.595	<b>29,55</b>

# ALUR PERENCANAAN DAN REALISASI KEGIATAN AKREDITASI

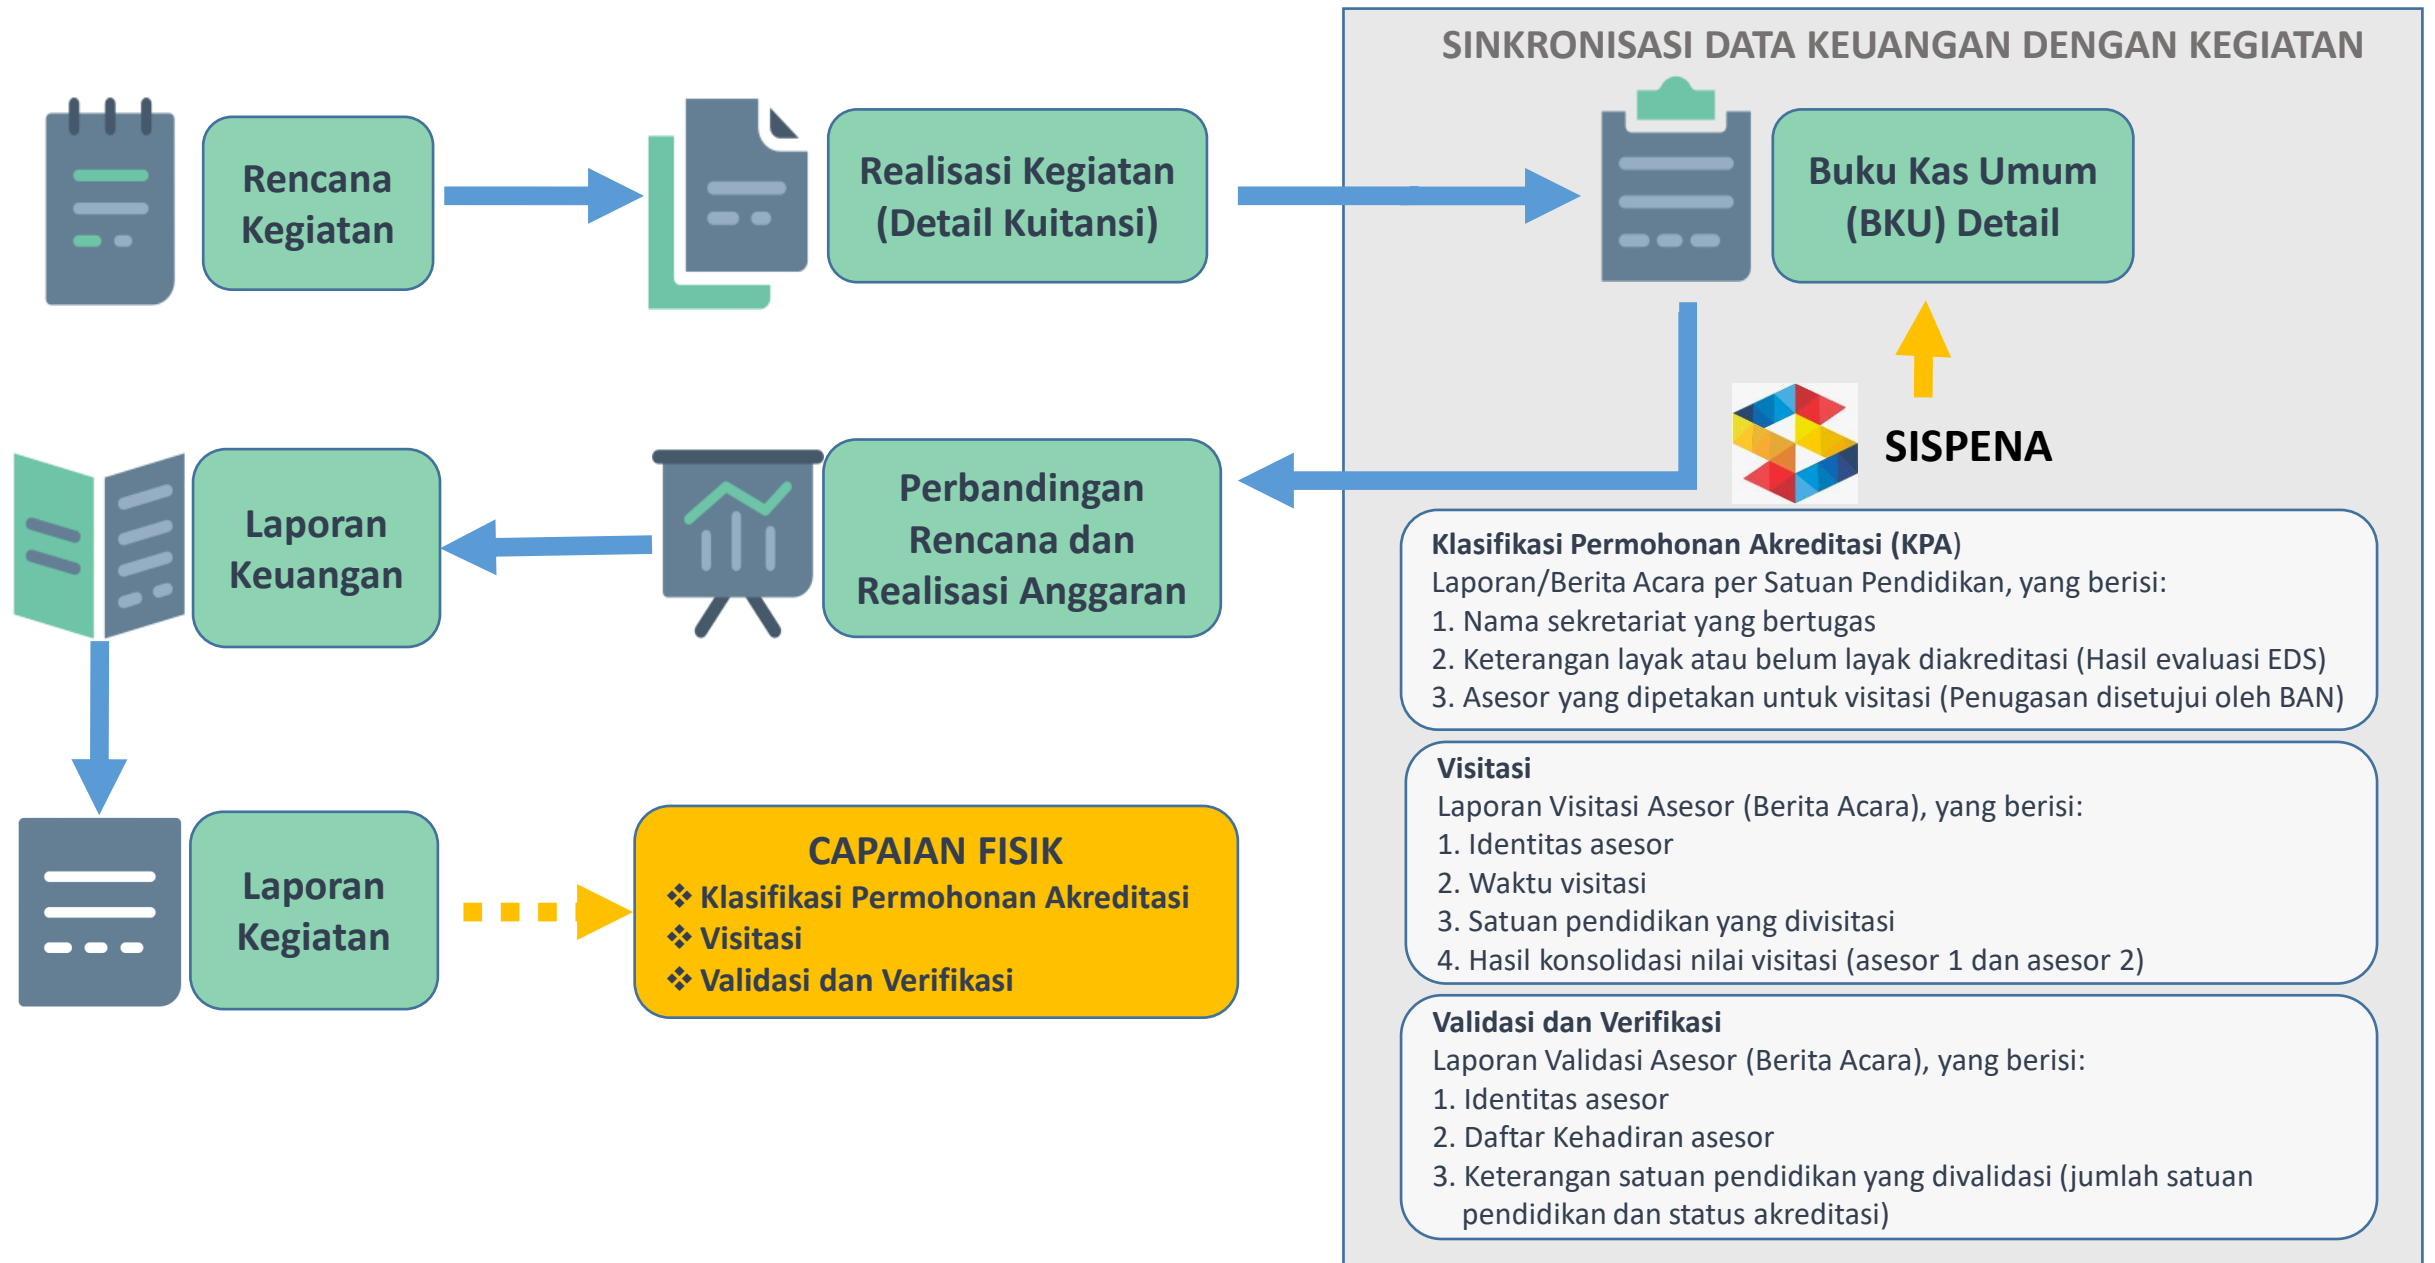

# ESTIMASI CAPAIAN KUOTA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI



KUOTA	TAHAPAN	BULAN					
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
150-500	EDS	50 - 160	50 - 170	50 - 170			
	KPA	50 - 160	50 - 170	50 - 170			
	VISITASI			50 - 160	50 - 170	50 - 170	
	VALIDASI					75 - 250	75 - 250
501-1000	EDS	150 - 300	175 - 350	176 - 350			
	KPA	150 - 300	175 - 350	176 - 350			
	VISITASI			120 - 250	120 - 250	130 - 250	131 - 250
	VALIDASI					250 - 500	251 - 500
1001-1500	EDS	300 - 500	350 - 500	351 - 500			
	KPA	300 - 500	350 - 500	351 - 500			
	VISITASI			250 - 375	250 - 375	250 - 375	251 - 375
	VALIDASI					500 - 750	501 - 750
4501-5000	EDS	1400 - 1600	1500 - 1650	1601 - 1750			
	KPA	1400 - 1600	1500 - 1650	1601 - 1750			
	VISITASI			1400 - 1600	1500 - 1650	1601 - 1750	
	VALIDASI				1400 - 1600	1500 - 1650	1601 - 1750
5001-5500	EDS	1600 - 1750	1650 - 1850	1751 - 1900			
	KPA	1600 - 1750	1650 - 1850	1751 - 1900			
	VISITASI			1600 - 1750	1650 - 1850	1751 - 1900	
	VALIDASI				1600 - 1750	1650 - 1850	1751 - 1900
5501-6000	EDS	1750 - 2000	1850 - 2000	1901 - 2000			
	KPA	1750 - 2000	1850 - 2000	1901 - 2000			
	VISITASI			1750 - 2000	1850 - 2000	1901 - 2000	
	VALIDASI				1750 - 2000	1850 - 2000	1901 - 2000

# 5

## Implementasi Penempatan Kantor BAN PAUD dan PNF Provinsi



# IMPLEMENTASI PENEMPATAN KANTOR BAN PAUD DAN PNF PROVINSI



NO	PROVINSI	LPMP	PP/BP-PAUD DAN DIKMAS
1	ACEH		√
2	SUMATERA UTARA		√
3	SUMATERA BARAT		√
4	RIAU		√
5	JAMBI	√	
6	SUMATERA SELATAN		√
7	BENGKULU	√	
8	LAMPUNG		√
9	KEPULAUAN BABEL	√	
10	KEPULAUAN RIAU	√	
11	DKI JAKARTA	BELUM PINDAH	
12	JAWA BARAT		√
13	JAWA TENGAH		√
14	DI. YOGYAKARTA		√
15	JAWA TIMUR		√
16	BANTEN		√
17	BALI		√

NO	PROVINSI	LPMP	PP/BP-PAUD DAN DIKMAS
18	NUSA TENGGARA BARAT		√
19	NUSA TENGGARA TIMUR		√
20	KALIMANTAN BARAT		BELUM PINDAH
21	KALIMANTAN TENGAH		√
22	KALIMANTAN SELATAN		√
23	KALIMANTAN TIMUR		√
24	KALIMANTAN UTARA	√	
25	SULAWESI UTARA		√
26	SULAWESI TENGAH		√
27	SULAWESI SELATAN		√
28	SULAWESI TENGGARA		√
29	GORONTALO		√
30	SULAWESI BARAT		√
31	MALUKU	√	
32	MALUKU UTARA	√	
33	PAPUA		BELUM PINDAH
34	PAPUA BARAT	√	

## Catatan :

- **BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta** belum pindah karena **sarana dan prasarana yang** diberikan oleh pihak **LPMP** belum memadai;
- **BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Barat** belum pindah karena **sarana dan prasarana** yang diberikan oleh pihak **BP PAUD dan Dikmas** belum siap untuk digunakan; dan
- **BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua** belum pindah karena **ruangan** yang diberikan **BP PAUD dan Dikmas** belum siap dan masih dalam tahap renovasi.

# TERIMA KASIH



<http://litbang.kemdikbud.go.id>



@litbangdikbud



@litbangdikbud



Balitbang Kemendikbud



Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia
